UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Sistema de Universidad Virtual
Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

## Proyecto VII

## Actividad 2.2

## Desarrollo del Sprint 1: Fundamentos y arquitectura

---

# Proyecto: Contragolpe Boxing App

*Aplicación de gestión y fidelización de miembros para Contragolpe Boxing Gym*

**Ricardo Fabián Navarro González**
Código: 211533337
Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web · UDG Virtual
Metodología ágil: Scrum
Septiembre de 2026

# Índice

**1. Datos generales del sprint3**
1.1 Contexto3

**2. Meta del sprint3**

**3. Sprint Planning4**
3.1 Historias seleccionadas4
3.2 Capacidad y esfuerzo4

**4. Sprint Backlog5**

**5. Criterios de aceptación6**
5.1 Historia #1 — Registro e inicio de sesión6
5.2 Historia #2 — Arquitectura base y repositorios6

**6. Definición de Hecho (DoD)7**

**7. Arquitectura base7**
7.1 Vista general7
7.2 Decisiones técnicas8
7.3 Estructura del repositorio8
7.4 Modelo de datos inicial8
7.5 Flujo de trabajo con Git9

**8. Cronograma del sprint9**

**9. Riesgos y supuestos10**
9.1 Riesgos10
9.2 Supuestos10

**10. Seguimiento del sprint11**
10.1 Burndown (horas restantes)11
10.2 Bitácora de Daily Scrum11

**11. Cierre del sprint12**
11.1 Sprint Review12
11.2 Evidencia del incremento12
11.3 Retrospectiva12
11.4 Ajustes al backlog12

**12. Referencias12**

# 1. Datos generales del sprint

| Elemento | Detalle |
|---|---|
| **Proyecto** | Contragolpe Boxing App — app móvil de miembros y panel administrativo. |
| **Sprint** | Sprint 1 · Semanas 1 y 2 de las 12 del proyecto. |
| **Objetivo del sprint** | Fundamentos y arquitectura (según la planeación de la Actividad 2.1). |
| **Historias incluidas** | #1 Registro e inicio de sesión · #2 Arquitectura base y repositorios. |
| **Metodología** | Scrum, con sprints de 2 semanas. |
| **Equipo** | Una persona que cubre todos los roles: Product Owner, Scrum Master, desarrollo web, desarrollo móvil y diseño UI/UX (Ricardo Fabián Navarro González). |
| **Capacidad estimada** | 64 horas (≈ 32 h por semana). |
| **Estado del documento** | Planeación del sprint completa. Las secciones 10 y 11 (seguimiento y cierre) se completan con los resultados reales durante y al final del sprint. |
| **Github Repo Link** | https://github.com/FabianNavarroDev/contragolpe-boxing-app |

## 1.1 Contexto

Este documento desarrolla el primer sprint de la planeación definida en la Actividad 2.1. En ese plan, el Sprint 1 establece la base técnica del proyecto y la primera funcionalidad de cara al miembro: poder crear una cuenta e ingresar a la aplicación. Todo lo que sigue (perfil, check-in por QR, visor de progreso, gamificación y contenido compartible) se construye sobre esta base.

# 2. Meta del sprint

> **Sprint Goal:** al cierre del Sprint 1, un miembro puede **registrarse e iniciar sesión** desde la aplicación móvil, sobre una **arquitectura base documentada** (repositorio, aplicaciones React y React Native inicializadas y backend configurado) lista para construir las siguientes historias.

La meta se considera lograda si se cumplen los criterios de aceptación de las historias #1 y #2 (sección 5) y se cuenta con evidencia para la Sprint Review.

# 3. Sprint Planning

## 3.1 Historias seleccionadas

Se toman las dos historias asignadas al Sprint 1 en el Product Backlog. Ambas tienen prioridad Alta porque son la base funcional del producto. Los puntos usan la escala Fibonacci empleada en el backlog inicial (Actividad 1.2).

| # | Historia de usuario | Prioridad | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Como miembro, quiero registrarme e iniciar sesión en la app, para tener acceso a mi perfil personal. | Alta | 5 |
| 2 | Como equipo de desarrollo, quiero definir la arquitectura base (React + React Native) y los repositorios del proyecto, para tener una base técnica ordenada. | Alta | 5 |

## 3.2 Capacidad y esfuerzo

Con un solo integrante, la capacidad se calcula de forma realista sobre el tiempo que se puede dedicar al proyecto: 10 días hábiles con aproximadamente 32 horas por semana. El esfuerzo planeado deja un pequeño margen para imprevistos.

| Concepto | Horas |
|---|---|
| **Historia #2 — Arquitectura base y repositorios (T2.1 a T2.6)** | 23 |
| **Historia #1 — Registro e inicio de sesión (T1.1 a T1.7)** | 33 |
| **Ceremonias de Scrum (planning, dailies, review y retrospectiva)** | 6 |
| **Total planeado** | **62** |
| **Capacidad del sprint** | 64 |
| **Margen para imprevistos** | 2 |

> **Nota:** las estimaciones son una primera aproximación del equipo y se ajustan con el avance real; el burndown de la sección 10 permite verificarlas día a día.

# 4. Sprint Backlog

Las historias se descomponen en tareas de máximo 8 horas, de modo que cada una pueda terminarse y verificarse en uno o dos días.

### Historia #2 — Arquitectura base y repositorios

| ID | Tarea | Horas | Estado |
|---|---|---|---|
| **T2.1** | Crear el repositorio en GitHub (monorepo con apps/mobile, apps/admin y docs), README, .gitignore y convención de ramas. | 3 | Por hacer |
| **T2.2** | Inicializar la app móvil con React Native + Expo + TypeScript y comprobar que corre en un dispositivo o emulador. | 4 | Por hacer |
| **T2.3** | Inicializar el panel administrativo con React + Vite + TypeScript y definir su estructura de carpetas. | 3 | Por hacer |
| **T2.4** | Configurar calidad de código (ESLint y Prettier) y manejo de variables de entorno (.env.example). | 3 | Por hacer |
| **T2.5** | Crear el proyecto en Supabase: autenticación por correo, tabla perfiles y políticas de seguridad (RLS). | 6 | Por hacer |
| **T2.6** | Redactar el documento de arquitectura: diagrama, decisiones técnicas y modelo de datos inicial. | 4 | Por hacer |
| | **Subtotal historia #2** | **23** | |

### Historia #1 — Registro e inicio de sesión

| ID | Tarea | Horas | Estado |
|---|---|---|---|
| **T1.1** | Diseñar las pantallas de autenticación (bienvenida, registro e inicio de sesión) con la identidad negro y verde lima. | 4 | Por hacer |
| **T1.2** | Configurar la navegación: flujo de autenticación separado del flujo de la app y pantalla de inicio protegida. | 4 | Por hacer |
| **T1.3** | Construir la pantalla y la lógica de registro (nombre, correo, teléfono, contraseña y aceptación del aviso de privacidad) con creación automática del perfil. | 8 | Por hacer |
| **T1.4** | Construir la pantalla y la lógica de inicio de sesión. | 5 | Por hacer |
| **T1.5** | Implementar persistencia de la sesión y cierre de sesión. | 4 | Por hacer |
| **T1.6** | Agregar validaciones de formulario y mensajes de error claros. | 4 | Por hacer |
| **T1.7** | Diseñar y ejecutar casos de prueba manuales; corregir los errores encontrados. | 4 | Por hacer |
| | **Subtotal historia #1** | **33** | |

### Ceremonias del sprint

| Ceremonia | Descripción | Horas |
|---|---|---|
| **Sprint Planning** | Al inicio del día 1: se confirma la meta, las historias y las tareas. | 2 |
| **Daily Scrum** | 10 minutos al inicio de cada jornada (10 días); se registra en la bitácora de la sección 10. | 2 |
| **Sprint Review** | Día 10: demostración del incremento contra los criterios de aceptación. | 1 |
| **Sprint Retrospective** | Día 10: qué salió bien, qué mejorar y acciones para el Sprint 2. | 1 |

# 5. Criterios de aceptación

## 5.1 Historia #1 — Registro e inicio de sesión

- **Registro exitoso:** dado que la persona no tiene cuenta, cuando completa el formulario con datos válidos y acepta el aviso de privacidad, entonces se crea su cuenta y su perfil y entra a la pantalla de inicio.
- **Correo duplicado:** dado un correo ya registrado, cuando intenta registrarse de nuevo, entonces ve un mensaje claro y no se crea una cuenta duplicada.
- **Inicio de sesión:** dado un miembro registrado, cuando ingresa sus credenciales correctas, entonces accede a la app; con credenciales incorrectas ve un mensaje de error que no revela qué dato falló.
- **Sesión persistente:** dado que inició sesión, cuando cierra y vuelve a abrir la app, entonces sigue con la sesión activa hasta que elija cerrar sesión.
- **Validaciones:** el correo debe tener formato válido y la contraseña al menos 8 caracteres; los errores se muestran junto al campo correspondiente.
- **Acceso protegido:** una persona sin sesión no puede ver las pantallas internas de la app.

## 5.2 Historia #2 — Arquitectura base y repositorios

- El repositorio en GitHub tiene la estructura definida en la sección 7.3 y un README con los pasos para ejecutar ambas aplicaciones.
- La app móvil y el panel administrativo se ejecutan localmente sin errores.
- El backend tiene autenticación por correo y la tabla de perfiles con RLS: cada usuario solo puede leer y editar su propio perfil.
- Ninguna credencial ni llave privada se incluye en el repositorio; las variables se manejan con archivos .env ignorados por Git y un .env.example de referencia.
- Existe un documento de arquitectura con diagrama, decisiones técnicas y modelo de datos inicial (este documento, sección 7).

> **Fuera del alcance del Sprint 1:** recuperación de contraseña, inicio de sesión con redes sociales, foto de perfil y estadísticas del miembro (historias #3 y #4, Sprint 2).

# 6. Definición de Hecho (DoD)


Una historia se considera terminada solo si cumple todos los puntos siguientes:

- Se cumplen todos los criterios de aceptación de la historia, verificados manualmente.
- El código está integrado en la rama develop mediante una rama feature con commits descriptivos.
- La aplicación se ejecuta sin errores y el linter no reporta problemas.
- No hay credenciales ni datos sensibles en el repositorio.
- El README y la documentación reflejan el estado actual del proyecto.
- Existe evidencia (capturas o video corto) guardada para la Sprint Review.

# 7. Arquitectura base

> **Estado de las decisiones:** esta arquitectura es la propuesta de trabajo para el sprint y se confirma al terminar T2.5. Cualquier ajuste se documenta en la retrospectiva.

## 7.1 Vista general

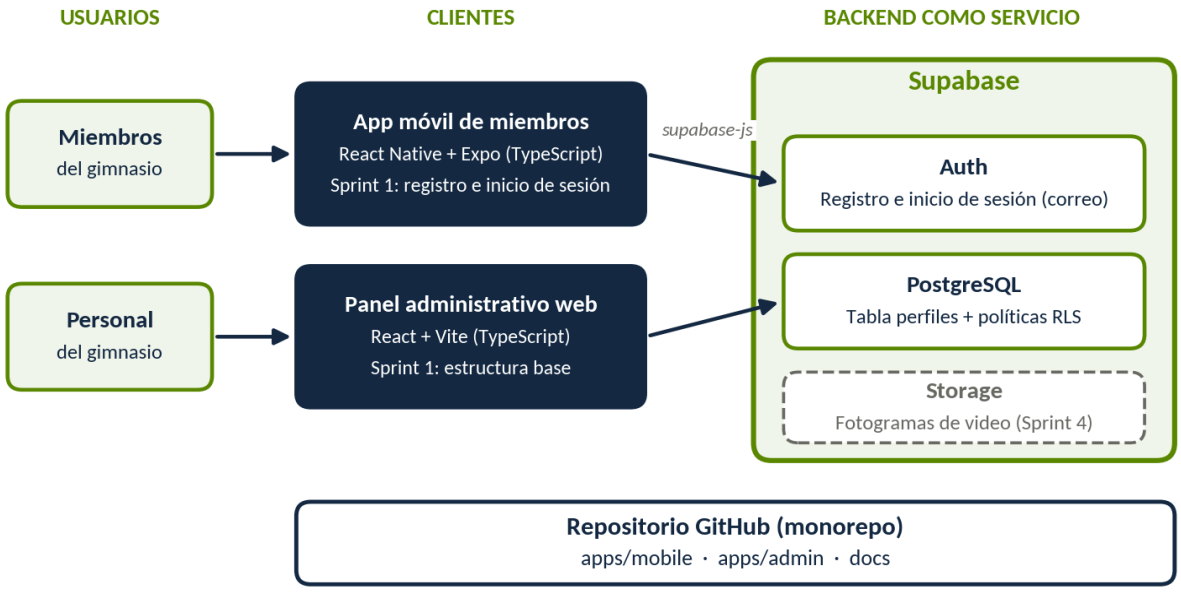


*Arquitectura base del proyecto: dos clientes React que consumen un backend como servicio (Supabase), con el código alojado en un monorepo de GitHub.*

## 7.2 Decisiones técnicas

| Componente | Elección | Justificación |
|---|---|---|
| **App móvil** | React Native con Expo y TypeScript | Arranque rápido sin configuración nativa inicial y pruebas en dispositivo físico con Expo Go. Coherente con el framework elegido en la Actividad 1.3. Si el procesamiento de video del Sprint 4 requiere módulos nativos, se evaluará un development build. |
| **Panel administrativo** | React con Vite y TypeScript | Herramienta ligera para una aplicación interna que no necesita renderizado en servidor; comparte lenguaje y patrones con la app móvil. |
| **Backend** | Supabase (PostgreSQL, Auth y Storage) | Los datos del proyecto (membresías, asistencias, rachas, logros) son relacionales y se consultan bien con SQL; incluye autenticación, seguridad por filas (RLS) y almacenamiento para los fotogramas del visor. Firebase se consideró como alternativa; sus consultas de agregación (comparativas y rachas) resultan más laboriosas. |
| **Código** | Monorepo en GitHub | Un solo repositorio para ambas aplicaciones y la documentación simplifica el control de versiones con un equipo de una persona. |

## 7.3 Estructura del repositorio

```
contragolpe-boxing-app/
|-- apps/
|   |-- mobile/      App de miembros (React Native + Expo)
|   `-- admin/       Panel administrativo (React + Vite)
|-- docs/            Documentación y arquitectura
|-- .gitignore
`-- README.md
```

## 7.4 Modelo de datos inicial

En el Sprint 1 solo se necesita una tabla, vinculada a la cuenta de autenticación. Los datos de membresía y estadísticas se agregan en el Sprint 2 (historia #3).

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| **id** | uuid (PK, FK a auth.users) | Identificador del usuario; coincide con su cuenta de autenticación. |
| **nombre** | texto | Nombre completo del miembro. |
| **telefono** | texto | Teléfono de contacto. |
| **rol** | texto | Rol del usuario: miembro (por defecto) o admin. |
| **fecha_alta** | fecha y hora | Momento del registro (valor por defecto: ahora). |
| **acepto_privacidad_en** | fecha y hora | Momento en que aceptó el aviso de privacidad. |

- **Creación del perfil:** un disparador (trigger) en la base de datos crea la fila de perfil cuando se registra un usuario nuevo.
- **Seguridad (RLS):** cada usuario autenticado puede leer y actualizar únicamente su propia fila. Los permisos del rol admin se definen al construir el panel de gestión (Sprint 6).

### 7.5 Flujo de trabajo con Git

- **main:** versión estable; solo recibe código al cierre de cada sprint.
- **develop:** rama de integración donde se unen las funcionalidades terminadas.
- **feature/nombre-de-la-tarea:** una rama por tarea (por ejemplo, feature/t1-3-registro), que se integra a develop al cumplir la Definición de Hecho.
- **Commits:** mensajes cortos y descriptivos que mencionen el ID de la tarea (por ejemplo, “T1.3: formulario de registro”).

## 8. Cronograma del sprint

Distribución de las tareas en los 10 días hábiles del sprint. El orden prioriza la base técnica (historia #2) para poder construir la autenticación sobre ella.

| Bloque | Actividades | Horas |
|---|---|---|
| **Semana 1 · Días 1–2** | Sprint Planning. T2.1 repositorio, T2.2 app móvil y T2.3 panel administrativo. | 12 |
| **Semana 1 · Días 3–5** | T2.4 calidad de código, T2.5 backend en Supabase, T2.6 documento de arquitectura y T1.1 diseño de pantallas. | 17 |
| **Semana 2 · Días 6–8** | T1.2 navegación, T1.3 registro y T1.4 inicio de sesión. | 17 |
| **Semana 2 · Días 9–10** | T1.5 sesión persistente, T1.6 validaciones y T1.7 pruebas. Sprint Review y Retrospectiva. | 14 |
| **Todo el sprint** | Daily Scrum de 10 minutos. | 2 |
| **Total** | | **62** |

## 9. Riesgos y supuestos

### 9.1 Riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|---|
| **Curva de aprendizaje de React Native y Expo.** | Media | Media | Hacer primero T2.2 para detectar problemas pronto y apoyarse en la documentación oficial. |
| **Primera configuración de autenticación y RLS en Supabase.** | Media | Alta | Empezar con políticas mínimas y probarlas con dos usuarios distintos. |

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|---|
| **Tiempo limitado al ser un solo integrante.** | Alta | Media | Capacidad calculada con margen; si hace falta, T1.6 se acota a las validaciones esenciales. |
| **Cambios de alcance por retroalimentación del foro.** | Baja | Baja | Registrar los cambios en el backlog y atenderlos en el siguiente sprint. |

## 9.2 Supuestos

- Se cuenta con un dispositivo móvil o emulador para probar la app.
- Se dispone de cuentas de GitHub y Supabase (capa gratuita) para el proyecto.
- La planeación de la Actividad 2.1 sigue vigente para este sprint.

# 10. Seguimiento del sprint

> **Uso:** se registra cada día las horas que restan del sprint y el resultado del Daily Scrum. La fila de horas ideales asume un avance constante de 6.2 horas por día.

## 10.1 Burndown (horas restantes)

| Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ideal** | 62 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31 | 24.8 | 18.6 | 12.4 | 6.2 | 0 |
| **Real** | | | | | | | | | | | |

## 10.2 Bitácora de Daily Scrum

En cada Daily se responden tres preguntas: ¿qué avancé desde el último día?, ¿qué haré hoy? y ¿qué me está bloqueando?

| Día | Avancé | Haré hoy | Bloqueos |
|---|---|---|---|
| **1** | *Por completar* | *Por completar* | *Por completar* |
| **2** | *Por completar* | *Por completar* | *Por completar* |
| **…** | | | |
| **10** | *Por completar* | *Por completar* | *Por completar* |

# 11. Cierre del sprint

**Por completar:** esta sección se llena al terminar el sprint con los resultados reales.

## 11.1 Sprint Review

| Historia | Criterios cumplidos | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **#1 Registro e inicio de sesión** | *Por completar* | *Por completar* | *Por completar* |
| **#2 Arquitectura base y repositorios** | *Por completar* | *Por completar* | *Por completar* |

## 11.2 Evidencia del incremento

Capturas o video corto que se anexarán:

- Repositorio de GitHub con la estructura y el historial de commits.
- App móvil y panel administrativo ejecutándose.
- Pantallas de registro, inicio de sesión y pantalla de inicio.
- Tabla de perfiles y usuarios en Supabase con RLS activo.

## 11.3 Retrospectiva

| ¿Qué salió bien? | ¿Qué se puede mejorar? | Acciones para el Sprint 2 |
|---|---|---|
| *Por completar* | *Por completar* | *Por completar* |

## 11.4 Ajustes al backlog

Cambios de prioridad, estimación o alcance derivados del sprint, y estado de la historia #3 (perfil de miembro) y #4 (foto de perfil) que abren el Sprint 2: *Por completar*

# 12. Referencias

Expo. (s. f.). Expo documentation. https://docs.expo.dev/

React. (s. f.). React – The library for web and native user interfaces. https://react.dev/

React Native. (s. f.). React Native · Learn once, write anywhere. https://reactnative.dev/

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. Scrum.org. https://scrumguides.org/

Supabase. (s. f.). Supabase documentation. https://supabase.com/docs

Vite. (s. f.). Vite: Next generation frontend tooling. https://vite.dev/
