CONTRAGOLPE
BOXING APP

Documento integrado de planeación y seguimiento

Proyecto VII · Actividad Integradora

Universidad de Guadalajara · Sistema de Universidad Virtual

Integrantes

Ricardo Fabián Navarro González
Fernando Tonatiuh Espinosa

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web
Metodología Scrum

Versión reorganizada: estructura, jerarquía de tareas y criterios de seguimiento unificados.

1. Propósito y alcance

Estedocumentoconsolidala preparacióninicial y la planeación de los sprints 1 a 5 de Contragolpe Boxing App. Se reorganizó el contenido para facilitar la lectura, dar prioridad a las tareas y mantener criterios uniformes para estimaciones, aceptación, riesgos y seguimiento.

Importante: las tareas de los sprints 3, 4 y 5 son propuestas de trabajo. La planeación no demuestra que una actividad se haya completado. Los estados y resultados deben actualizarse con evidencia real del repositorio y del tablero.

Contenido

Sección	Contenido
1	Propósito y alcance
2	Resumen del proyecto
3	Equipo y forma de trabajo
4	Sprint 1 — Preparación inicial
5	Sprint 2 — Base técnica y planeación
6	Sprint 3 — Registro e inicio de sesión
7	Sprint 4 — Perfil de los miembros
8	Sprint 5 — Registro de asistencia mediante QR
9	Seguimiento, riesgos y definición de hecho
10	Conclusiones y referencias

Cómo usar el documento

- Consultar el objetivo y las dependencias antes de iniciar cada sprint.
- Actualizar el estado de cada tarea y añadir enlaces a commits, Pull Requests, pruebas o capturas.
- Al cierre, comparar lo planeado con lo realizado y completar la retrospectiva.
- Si lacapacidadreal no alcanza, priorizarelMVP y mover tareas secundarias al backlog.

2. Resumen del proyecto

Descripción. Aplicaciónparaapoyar la gestiónyfidelización de miembros de Contragolpe Boxing Gym. El alcance priorizado contempla autenticación, perfil de miembro, registro de asistencia mediante QR y consulta de progreso.

Objetivo general. Construir progresivamente una versión funcional que permita identificar a los miembros y apoyar procesos habituales del gimnasio, ajustando el alcance a la capacidad real del equipo.

Principios de trabajo

- Priorizar las funciones esenciales del producto mínimo viable (MVP).
- Planear según la disponibilidad confirmada y reservar margen para imprevistos.
- Dividir funciones grandes en tareas pequeñas, revisables y comprobables.
- Registrar el trabajo real y no asumir que una tarea se completó por haber sido planeada.
- Revisar el backlog después de cada retrospectiva.

Herramienta / tecnología	Uso previsto
GitHub	Repositorio, ramas, commits, Pull Requests y revisión cruzada del código.
Trello	Organización y seguimiento de tareas del sprint.
Supabase	Autenticación, almacenamiento de perfiles y políticas de acceso.
React Native + Expo + TypeScript	Aplicación móvil para miembros.
React + Vite + TypeScript	Panel administrativo web.

Repositorio: github.com/FabianNavarroDev/contragolpe-boxing-app

Capacidad estimada: aproximadamente 5 horas semanales por persona; 10 horas combinadas. En un sprint de cuatro semanas, la capacidad bruta es de unas 40 horas antes de ceremonias, coordinación e imprevistos.

3. Equipo y forma de trabajo

Integrante	Participación
Ricardo Fabian Navarro Gonzalez	Participa desde el inicio; Product Owner según la distribución documentada.
Fernando Tonatiuh Espinosa	Se incorpora a partir del Sprint 2.

Rol / área	Responsabilidad acordada
Product Owner	Ricardo prioriza el backlog y traduce necesidades del gimnasio en historias de usuario.
Scrum Master	Ambos facilitan coordinación, seguimiento y revisión de acuerdos.
Backend y arquitectura	Trabajo compartido en Supabase, base de datos y documentación técnica.
Desarrollo móvil y frontend web	Trabajo compartido en la app de miembros y el panel administrativo.
Revisión de código	Cada integrante revisa el Pull Request del otro antes de integrar cambios.

Flujo de trabajo en GitHub

• Crear una rama feature desde develop por cada tarea.

• Realizar cambios pequeños y descriptivos; no subir credenciales ni archivos sensibles.

• Subir la rama y abrir un Pull Request hacia develop.

• El otro integrante revisa, solicita ajustes si hacen falta y aprueba cuando corresponde.

• Integrar mediante merge después de la revisión; eliminar la rama cuando ya no sea necesaria.

• Al cierre, comprobar el estado del proyecto y, si procede, integrar develop en main y etiquetar la versión.

La planeación contempla reuniones de seguimiento dos veces por semana, adaptadas a la disponibilidad real de los integrantes.

4. Sprint 1 — Preparación inicial

Objetivo:establecer labase delrepositorioeiniciarlaarquitecturadel proyecto, además de comenzar las historias relacionadas con el registro e inicio de sesión.

Actividades y estado reportado al cierre

Actividad	Estado reportado
Crear repositorio, estructura de carpetas, README y .gitignore	Completada
Inicializar aplicación móvil con React Native + Expo	Pendiente
Inicializar panel administrativo con React + Vite	Pendiente
Configurar ESLint, Prettier y variables de entorno	Pendiente
Configurar Supabase, perfiles y políticas RLS	Pendiente
Redactar documento de arquitectura	Pendiente
Implementar registro e inicio de sesión	Pendiente

Aprendizajes y decisiones

• La capacidad real de una sola persona no alcanzó para completar el alcance planeado.

• La incorporación de un segundo integrante requiere tiempo de onboarding.

• Se decidió trabajar con Pull Requests y revisión cruzada para mejorar trazabilidad y calidad.

• Las tareas pendientes se trasladaron a la planificación del Sprint 2.

Evidencia mencionada: el repositorio contabacondos commits enmaincorrespondientes a la estructura inicial.

5. Sprint 2 — Base técnica y planeación

Objetivo: completar la base técnicapendientedelSprint 1: inicializaraplicaciones,configurar herramientas de calidad, preparar Supabase y diseñar pantallas de autenticación. La implementación funcional del registro e inicio de sesión se dejó para el Sprint 3.

Backlog organizado

ID	Actividad	Responsable previsto	Estimación
T2.1	Crear repositorio, estructura de carpetas, README y documentación	Fernando	4 h
T2.2	Inicializar app móvil (React Native + Expo + TypeScript)	Fernando, con apoyo de Ricardo	4 h
T2.3	Inicializar panel administrativo (React + Vite + TypeScript)	Fernando	3 h
T2.4	Configurar ESLint, Prettier y variables de entorno	Fernando	3 h
T2.5	Configurar Supabase, autenticación, tabla de perfiles y políticas RLS	Ricardo	6 h
T2.6	Redactar documento de arquitectura	Ricardo	4 h
T2.7	Diseñar pantallas de bienvenida, registro e inicio de sesión	Ricardo	4 h

Nota de organización: se normalizó la numeración del backlog del Sprint 2 para que todas las tareas usen el prefijo T2; el contenido y las estimaciones se conservaron.

Capacidad y calendario	Estimación
Tareas y onboarding	25 horas

Capacidad y calendario	Estimación
Ceremonias y revisión de Pull Requests	6 horas
Total planeado	34 horas
Capacidad bruta para cuatro semanas	40 horas
Margen para imprevistos	6 horas

Criterios de aceptación

- Las aplicaciones se inicializan yejecutan sin errores de configuración.
- Las herramientas de calidad y variables de entorno quedan configuradas sin exponer secretos.
- Supabase queda preparado para autenticación y perfiles, con políticas de acceso documentadas.
- Las pantallas de autenticación tienen un diseño definido.
- La arquitectura y las decisiones técnicas quedan documentadas en el repositorio.
- Los cambios se integran mediante Pull Requests revisados.

Riesgos y mitigación

Riesgo	Respuesta prevista
Disponibilidad semanal variable	Mantener margen de horas y reducir alcance si hace falta.
Nuevo integrante sin contexto	Reservar horas de onboarding y comenzar con tareas guiadas.
Dificultad para coordinar horarios	Usar comunicación asíncrona y acuerdos escritos.
Avance inferior al planeado	Revisar el backlog y conversar con el asesor para ajustar el alcance.

6. Sprint 3 — Registro e inicio de sesión

Objetivo: Implementar progresivamentelaautenticación.Elusuariodebepoderregistrarse e iniciar sesión con validaciones y respuestas claras ante errores.

Alcance y actividades

• Revisar el estado real de las pantallas y de Supabase antes de comenzar.

• Conectar el formulario de registro con el servicio de autenticación.

• Implementar inicio de sesión y manejo de estados de sesión.

• Validar campos obligatorios y formato de los datos.

• Mostrar mensajes comprensibles de éxito y error sin exponer información sensible.

• Probar los flujos principales, registrar defectos e integrar cambios mediante Pull Requests.

Backlog de trabajo

ID	Actividad / entregable	Prioridad	Estimación	Criterio de finalización
S3.1	Revisar configuración y pendientes de autenticación	Alta	3 h	Lista de pendientes y dependencias identificadas.
S3.2	Implementar registro de usuarios	Alta	7 h	Registro conectado al servicio y con manejo de errores.
S3.3	Implementar inicio de sesión	Alta	6 h	Inicio de sesión válido y respuesta ante credenciales incorrectas.
S3.4	Añadir validaciones de formularios	Alta	4 h	Campos obligatorios y formatos revisados antes de enviar.
S3.5	Manejar estados de sesión y navegación básica	Alta	5 h	La navegación responde al estado de autenticación.
S3.6	Realizar pruebas y corregir defectos	Alta	5 h	Pruebas principales registradas y defectos críticos atendidos.
S3.7	Revisión de código y documentación	Media	4 h	Pull Request revisado y documentación actualizada.
S3.8	Coordinación, review y retrospectiva	—	6 h	Review y retrospectiva realizadas.

Estimación total del backlog: 40 horas, incluidas coordinación, review y retrospectiva. Es una estimación de planeación, no un registro de horas reales.

Criterios de aceptación

• El registro se completa con datos válidos.

• El sistema informa si faltan campos o los datos no cumplen las validaciones.

• Un usuario registrado inicia sesión con credenciales correctas.

• Las credenciales incorrectas producen un error y no permiten el acceso.

• Los secretos y credenciales no se guardan en el repositorio.

• Los cambios se revisan y prueban antes de considerarse terminados.

Riesgos y medidas de mitigación

Riesgo	Impacto	Medida propuesta
incompleta	Medio/alto	Verificar dependencias al inicio y reducir alcance si hay bloqueos.
La depuración de autenticación toma más tiempo del previsto	Alto	Dividir el trabajo y priorizar el flujo mínimo funcional.
Errores de validación sin probar	Medio	Usar una lista breve de casos de prueba y registrar resultados.

Acciones propuestas para el siguiente sprint

• Confirmarelestadodeautenticaciónantesdeampliarelperfil.

• Corregir defectos críticos pendientes.

• Actualizar tablero con estados reales y estimaciones aprendidas.

• Conservar la revisión cruzada de Pull Requests.

Cierre y retrospectiva: completar con los resultados reales. No marcar como terminada una tarea sin evidencia verificable.

7. Sprint 4 — Perfil de los miembros

Objetivo: Construir una primera versión de la pantalla de perfil para consultar información básica. Depende de que la autenticación esté suficientemente estable; los bloqueos importantes deben corregirse antes de ampliar el alcance.

Alcance y actividades

• Revisar losdatosdeperfil disponibles y el vínculo entre usuario autenticado y perfil.

• Definir campos visibles y cuáles pueden editarse, si corresponde.


• Construir la pantalla y sus estados de carga, error y ausencia de información.

• Conectar la pantalla con la fuente de datos prevista.

• Comprobar que cada usuario solo consulte sus propios datos.

• Probar perfiles completos e incompletos, errores de conexión y documentar decisiones.

Llamada para revision de avance del sprint 4

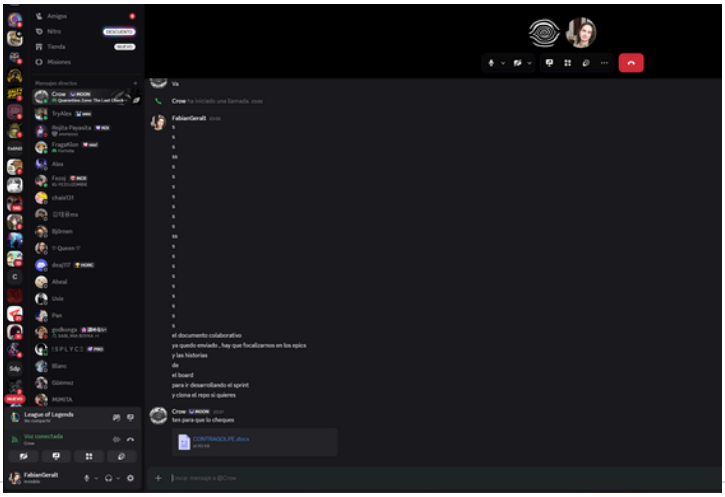

Backlog de trabajo

ID	Actividad / entregable	Prioridad	Estimación	Criterio de finalización
S4.1	Revisar estructura de perfiles y dependencias	Alta	3 h	Campos disponibles y reglas de acceso documentados.
S4.2	Definir estructura visual del perfil	Alta	3 h	Pantalla organizada con campos acordados.
S4.3	Implementar pantalla de perfil	Alta	7 h	La pantalla muestra la información básica del miembro.
S4.4	Conectar perfil con autenticación y datos	Alta	6 h	Se consulta el perfil asociado a la sesión activa.
S4.5	Manejar carga, errores y datos faltantes	Media	4 h	La interfaz informa estados sin quedar bloqueada.
S4.6	Verificar permisos y privacidad de datos	Alta	4 h	No se expone el perfil de otro usuario.
S4.7	Pruebas, correcciones y documentación	Media	5 h	Casos principales probados y cambios documentados.
S4.8	Coordinación, review y retrospectiva	—	6 h	Resultados y acuerdos del equipo registrados.

Estimación total del backlog: 38 horas, incluidas coordinación, review y retrospectiva. Es una estimación de planeación, no un registro de horas reales.

Criterios de aceptación

- El usuario autenticado puedeabrir su perfil.
- La pantalla muestra los campos básicos definidos para el MVP.
- La interfaz presenta carga y mensajes ante errores o datos faltantes.
- La consulta respeta reglas de acceso y no permite ver datos de otros miembros.
- La funcionalidad se prueba con datos de ejemplo y sesión válida.
- Los cambios quedan revisados e integrados según el flujo de GitHub.

Riesgos y medidas de mitigación

Riesgo	Impacto	Medida propuesta
prevista	Medio/alto	interfaz.
La autenticación sigue presentando defectos	Alto	Reservar capacidad para corregir bloqueos y recortar funciones no esenciales.
Se intenta incluir edición sin reglas definidas	Medio	Limitar el alcance a consulta de información básica, salvo acuerdo explícito.

Acciones propuestas para el siguiente sprint

- Resolver errores pendientes deautenticaciónoconsultadeperfiles.
- Acordar los datos necesarios para registrar asistencia.
- Mantener actualizados tablero, documentación y Pull Requests.
- Preparar el diseño del flujo de asistencia sin asumir que el QR ya está implementado.

Cierre y retrospectiva: completar con los resultados reales. No marcar como terminada una tarea sin evidencia verificable.

8. Sprint 5 — Registro de asistencia mediante QR

Objetivo: Iniciareldesarrollodel registro deasistenciamediante QRpara facilitarelcontrolde visitas.Se busca definir y probar un flujo mínimo sin asumir que la lectura, los permisos de cámara o el almacenamiento ya funcionan.

Alcance y actividades

• Definir el flujo y quién escanea el QR: miembro o personal autorizado.

• Acordar qué información identifica el código y evitar datos personales innecesarios en él.

• Diseñar la pantalla y los estados de permiso, lectura, éxito y error.

• Preparar datos para registrar usuario, fecha y hora de asistencia.

• Investigar o integrar una solución QR compatible con el entorno técnico.

• Conectar el flujo con la base de datos y validar autorizaciones.

• Probar códigos válidos, no reconocidos, permisos denegados y registros duplicados.

Backlog de trabajo

ID	Actividad / entregable	Prioridad	Estimación	Criterio de finalización
S5.1	Definir flujo de asistencia y datos mínimos	Alta		Flujo y campos mínimos documentados.
S5.2	Diseñar pantalla de asistencia	Alta	3 h	Pantalla y estados principales definidos.
S5.3	Preparar estructura para registros de asistencia	Alta	5 h	Estructura de datos y permisos revisados.
S5.4	Investigar e implementar lectura básica de QR	Alta	7 h	La aplicación reconoce un código de prueba en el entorno previsto.
S5.5	Conectar lectura con identificación y registro	Alta	6 h	Un código válido inicia el flujo de registro autorizado.
S5.6	Probar errores, duplicados y permisos	Alta	4 h	Casos principales probados y resultados documentados.
S5.7	Revisión de código y documentación	Media	3 h	Pull Request revisado y decisiones documentadas.
S5.8	Coordinación, review y retrospectiva	—	6 h	Resultados y próximos pasos registrados.

Estimación total del backlog: 37 horas, incluidas coordinación, review y retrospectiva. Es una estimación de planeación, no un registro de horas reales.

Criterios de aceptación

• El flujo esperado y los datos mínimos quedan documentados.

• La pantalla comunica si puede iniciar la lectura del QR.

• Un código de prueba válido se reconoce si se completa la integración técnica.

• Los códigos no reconocidos, permisos denegados y errores de conexión no se registran como asistencia exitosa.

• El registro se vincula a una identidad válida y respeta reglas de acceso.

• Se revisa cómo evitar duplicados y se documentan pruebas y limitaciones.

Riesgos y medidas de mitigación

Riesgo	Impacto	Medida propuesta
permisos adicionales	Alto	integración completa.
No están definidas las reglas de generación o asignación del QR	Alto	Acordar quién genera el código, quién lo escanea y cómo se valida.
Registros duplicados o no autorizados	Alto	Definir validaciones, permisos y pruebas de duplicados antes de aceptar la función.

Acciones propuestas para el siguiente sprint

• Completarlaspartes delflujo QRque quedenpendientes.

• Corregir defectos de lectura, permisos o persistencia.

• Evaluar el historial de asistencia como posible mejora posterior.

• Reevaluar el alcance según el tiempo disponible y los resultados de las pruebas.

Cierre y retrospectiva: completar con los resultados reales. No marcar como terminada una tarea sin evidencia verificable.

9. Seguimiento, riesgos y definición de hecho

Definición de Hecho (DoD)

Unatarea puedeconsiderarse terminada cuando cumple los criterios aplicables y existe evidencia suficiente. Esta lista adapta la definición incluida en la planeación y debe ajustarse si el equipo o el asesor establecen requisitos adicionales.

• Se cumplen los criterios de aceptación acordados.

• El código se ejecuta en el entorno previsto sin errores bloqueantes conocidos.

• Los cambios se integran mediante un Pull Request revisado.

• No se suben contraseñas, tokens ni otros secretos al repositorio.

• Se realizaron las pruebas necesarias y se registraron los resultados.

• La documentación y el tablero se actualizaron.

• Existe evidencia verificable: commit, Pull Request, captura, prueba o registro de tarea.

Registro mínimo de seguimiento por sprint

Dato	Qué registrar
Periodo	Fecha real de inicio y cierre del sprint.
Capacidad	Horas disponibles y horas realmente dedicadas, si se registran.
Tareas	ID, responsable, estado final y enlace a evidencia.
Bloqueos	Problema, impacto, decisión tomada y responsable de seguimiento.
Review	Qué se pudo demostrar al cierre del sprint.
Retrospectiva	Qué funcionó, qué mejorar y acciones acordadas.
Siguiente sprint	Tareas arrastradas y cambios de prioridad.

Riesgos generales del proyecto

Riesgo	Respuesta recomendada
Disponibilidad limitada del equipo	Priorizar funciones esenciales y comprometer menos tareas que la capacidad bruta.
Dependencias técnicas pendientes	Verificar primero las dependencias de las tareas planeadas.
Falta de evidencia	Adjuntar enlaces a commits, Pull Requests, tablero o pruebas.
Alcance excesivo	Posponer funciones secundarias y revisar el MVP con el asesor.
Comunicación insuficiente	Mantener acuerdos escritos y actualizar el tablero periódicamente.

Plantilla para el cierre de cada sprint

Campo	Registro del equipo
Objetivo planeado	Completar.
Resultado real	Completar con evidencia.
Tareas completadas	IDs y enlaces.
Tareas pendientes	IDs y motivos.
Horas estimadas / reales	Completar si se registraron.
Problemas principales	Completar.
Acciones para el siguiente sprint	Completar durante la retrospectiva.

10. Conclusiones

Laevolución documentada de Contragolpe Boxing App destaca la necesidad de ajustar el trabajo a la capacidad real del equipo. El Sprint 1 estableció la base inicial del repositorio; sus pendientes llevaron a incorporar un segundo integrante, considerar el onboarding y adoptar revisiones mediante Pull Requests.

La secuencia de los sprints 2 a 5 prioriza primero la base técnica, después la autenticación, el perfil del miembro y finalmente el registro de asistencia mediante QR. Esta organización reduce dependencias y permite avanzar de forma incremental. El valor de Scrum no consiste únicamente en planear tareas, sino en contrastar la planeación con los resultados, identificar obstáculos y acordar ajustes concretos.

Antes de presentar el documento como reporte final, el equipo debe actualizar fechas, responsables si cambiaron, estados, horas reales, resultados de retrospectivas y evidencias de cada sprint.

Referencias y enlaces de trabajo

• **Repositoriodelproyecto:**https://github.com/FabianNavarroDev/contragolpe-boxing-app

• **Atlassian. Métricas de Scrum:** https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics

• **Atlassian. Sprint planning:** https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprint-planning

• **Compara Software (2021). ¿Cuáles son los documentos entregables Scrum?:**

https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/

• **ittude. ¿Qué es un sprint en Scrum?:** https://ittude.com.ar/b/scrum/que-es-un-sprint/

• **Pérez, A. (2021). Las 5 etapas en los sprints de un desarrollo Scrum. OBS Business School:**

https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum

• **Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum:** https://scrumguides.org/
